



La società
della
ragione



GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE
PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
DEL COMUNE DI UDINE



Associazione "ICARO"
Volontariato Giustizia

UDINE CONTROCORRENTE: UNA RIVOLUZIONE GENTILE

Convegno

Giovedì 7 novembre 2024
Udine - Sala Ajace

Palazzo d'Aronco, via Nicolò Lionello 1



Autore: TONI ZANUSSI

CAMBIANO I MURI CAMBIARE LE RELAZIONI

IL CARCERE DI UDINE IN
TRASFORMAZIONE
PROGETTI PER LA CASA
CIRCONDARIALE

***SINTESI DELLO STATO DELLE
ATTIVITA' INSERITE NEL PROGRAMMA
TRIENNALE
2021 – 2022 – 2023 E DEGLI INTERVENTI
PREVISTI NEL PROGRAMMA 2024***

arch. Daniela DI CROCE

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
UFFICIO III – Coordinamento tecnico e gestione dei beni immobili



SINTESI DELLO STATO DELLE ATTIVITA' INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2021 – 2022 – 2023 E PREVISIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGRAMMA PER IL 2024 PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI UDINE

Le attività qui di seguito elencate e le successive schede riguardano i procedimenti ultimati a partire dal **31 marzo 2021**, data di trasmissione del programma triennale di edilizia penitenziaria, per un periodo di tempo pari a circa **tre anni e mezzo**.

PROCEDIMENTI CONCLUSI

- 1) 2021-ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA VERIFICA DELL'INTERESSE STORICO CULTURALE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL DLGS N. 42/2004 NEL DICEMBRE 2020. EMESSO PROVVEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DELL'INTERESSE STORICO CULTURALE PER IL COMPLESSO CARCERE GIUDIZIALE N. 0004587 IL 06/06/2022***
- 2) 2021-AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER LA REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA (conclusa nel DICEMBRE 2021)***
- 3) 2021-AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DIAGNOSI ENERGETICA CON RILASCIO DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'ISTITUTO (conclusa nel GENNAIO 2022)***
- 4) 2021-REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI DELL'INTERO ISTITUTO (concluso a DICEMBRE 2021) progetto elaborato dai tecnici dell'Amministrazione***

5) 2021-REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' DEGLI INTERVENTI DEL I LOTTO (Semiliberi – Ex Femminile – campo calcetto) (concluso nel GIUGNO 2021) progetto elaborato dai tecnici dell'Amministrazione

6) 2021-GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI DELL'INTERO ISTITUTO (lavori ultimati a MARZO 2023)

7) 2022-AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO PRINCIPALE (concluso a MARZO 2022)

8) 2021-AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DEL I LOTTO (Semiliberi – Ex Femminile – campo calcetto) (concluso ad APRILE 2022)

9) 2021-AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO I LOTTO (Semiliberi – Ex Femminile – campo calcetto) (concluso a LUGLIO 2022)

10) DEFINIZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E UNIVERSITA' DI UDINE – DIPARTIMENTO POLITECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (definito ad OTTOBRE 2022)

11) 2022-REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' DEGLI INTERVENTI DEL II LOTTO (sala polivalente - teatro e settore colloqui) (concluso da AGOSTO 2022) progetto elaborato dai tecnici dell'Amministrazione

12) 2022-AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIVALENTE/TEATRO (concluso ad AGOSTO 2023)

13) 2022-AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE COLLOQUI E REALIZZAZIONE AREA VERDE PER COLLOQUI ALL'APERTO (concluso ad AGOSTO 2023)

14) 2022-REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI PENSILINE FOTOVOLTAICHE NEL PARCHEGGIO DELLA CASERMA AGENTI (concluso ad ottobre 2022) progetto elaborato dai tecnici dell'Amministrazione

15) 2023-AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI PENSILINE FOTOVOLTAICHE NEL PARCHEGGIO DELLA CASERMA AGENTI (concluso a OTTOBRE 2024)


16) 2023-GARA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIVALENTE/TEATRO - Gara CONCLUSA - Contratto stipulato il 22/04/2024

17) 2024-AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER l'incarico di Direzione lavori e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione a professionista esterno – Contratto stipulato in data Consegna dei lavori prevista per la metà di novembre 2024

18) 2024-GARA PER I LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE COLLOQUI E REALIZZAZIONE AREA VERDE PER COLLOQUI ALL'APERTO – Gara conclusa – Contratto stipulato in data 12/09/2024 - In attesa dell'approvazione del contratto e registrazione all'U.C.B.

CASA CIRCONDARIALE UDINE

INTERVENTI IN CORSO DI ESECUZIONE, IN FASE DI APPALTO, IN CORSO DI PROGETTAZIONE E IN PROGRAMMA

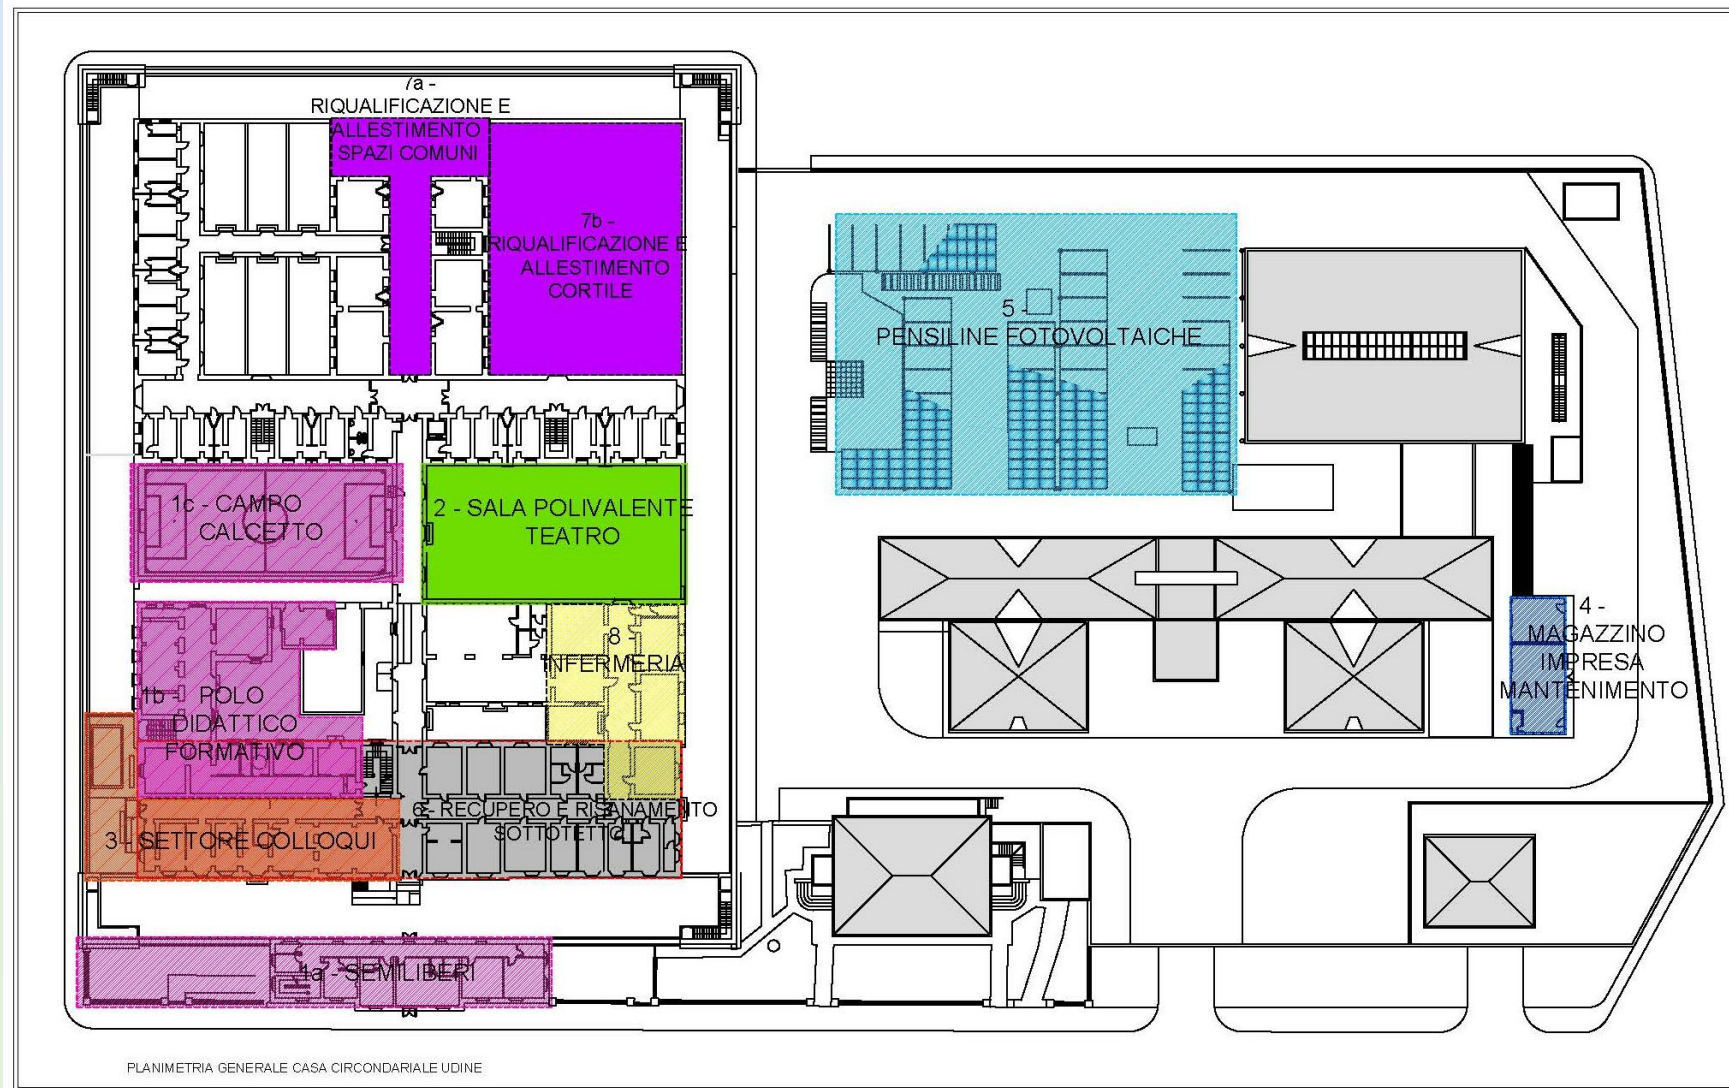

- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------|---|---------------------|---|-------------------------|---|--------------|---|------------|---|-------------------------|---|------------|
| | SEMILIBRI
POLO DIDATTICO/FORMATIVO
CAMPO CALCETTO | | SALA POLIVALENTE
TEATRO | | SETTORE
COLLOQUI | | IMPRESA
MANTENIMENTO | | FOTOVOLTAICO | | SOTTOTETTO | | SPAZI COMUNI
CORTILE | | INFERMERIA |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |

PROCEDIMENTI IN CORSO

- 1) **LAVORI INTERVENTI I LOTTO (Semiliberi – Ex Femminile – campo calcetto) - LAVORI IN CORSO – Ultimati i lavori alla SEZIONE SEMILIBERTA’ – Consegna anticipata della Sezione Semiliberi in data 30 aprile 2024. Ultimati lavori all’Area didattica e aule scolastiche – Consegna anticipata in data 04 ottobre 2024. Fine lavori prevista per dicembre 2024**
- 2) **LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIVALENTE/TEATRO – Contratto stipulato. Consegna dei lavori prevista per la metà di novembre. Tempi previsti 260 gg naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.**
- 3) **LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE COLLOQUI E REALIZZAZIONE AREA VERDE PER COLLOQUI ALL’APERTO – Contratto stipulato, in attesa dell’approvazione e registrazione all’U.C.B.**
- 4) **GARA PER LA REALIZZAZIONE DI PENSILINE FOTOVOLTAICHE NEL PARCHEGGIO DELLA CASERMA AGENTI - Progetto validato - in corso procedure per l’avvio della gara d’appalto.**
- 5) **PROGETTO DI RECUPERO E RISANAMENTO SOTTOTETTO EDIFICIO CENTRALE Progettazione esecutiva affidata a società di progettazione, in corso sopralluoghi preliminari all’avvio dell’esecuzione del contratto**

6) PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E ALLESTIMENTO SPAZI COMUNI DETENZIONE CAMEROTTI
(Documento di Indirizzo alla Progettazione in corso di elaborazione)

7) PROGETTO PER REALIZZAZIONE MANUFATTO DA ADIBIRE A MAGAZZINO IMPRESA MANTENIMENTO *(in corso – da inserire nella programmazione 2024)*

8) PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA INFERMERIA AL PIANO TERRA DELL'ISTITUTO *(Inserito nella programmazione 2024 – In corso di redazione Documento di indirizzo alla progettazione – Avviati contatti con Azienda sanitaria locale per Redazione quadro esigenziale)*

9) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NEL PERIMETRO DELLA CASERMA AGENTI *(Appalto aggiudicato – in attesa della nomina di Direttore dei lavori e di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione In corso redazione di perizia per avvio procedure di gara su MEPA da parte della Direzione dell'Istituto)*

10) Lavori di manutenzione straordinaria del piano terra della sezione detentiva -I^a Sezione

In questo arco temporale (fine 2020 ad oggi) sono stati raggiunti risultati concreti, grazie all'impegno e allo sforzo compiuto da parte di tutti i soggetti coinvolti, sia nella fase programmatica, che progettuale, che autorizzativa e infine esecutiva dei vari procedimenti.

ZONA «A»


RISTRUTTURAZIONE
EDIFICIO SU VIA SPALATO
PER LA CREAZIONE DI
UNA SEZIONE DI
SEMILIBERTA'

ZONA «B»

RISTRUTTURAZIONE
DELL'EDIFICIO EX
FEMMINILE PER LA
CREAZIONE DI UN POLO
DIDATTICO-FORMATIVO

ZONA «C»

RIQUALIFICAZIONE DEL
CORTILE DI PASSEGGIO
DESTINATO AD ATTIVITA'
LUDICHE E SPORTIVE

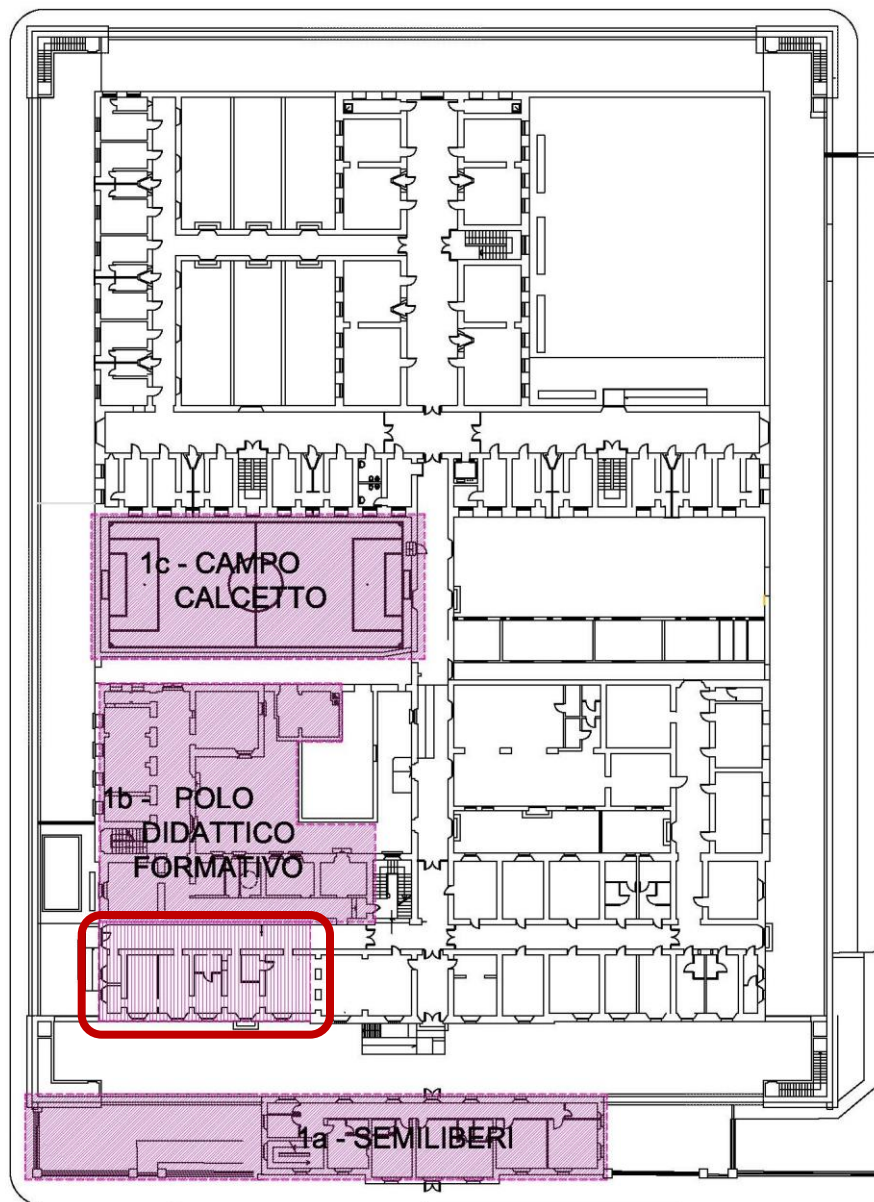


PLANIMETRIA GENERALE CASA CIRCONDARIALE UDINE

RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SU VIA SPALATO PER LA CREAZIONE DI UNA SEZIONE DI SEMILIBERTA', DELL'EDIFICIO EX FEMMINILE PER LA CREAZIONE DI UN POLO DIDATTICO-FORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE DI PASSEGGIO DESTINATO AD ATTIVITA' LUDICHE E SPORTIVE

ESIGENZE DIREZIONE

- Creare un settore per i detenuti semiliberi con accesso indipendente dall'esterno;
- Creare maggiori spazi per le attività trattamentali, e soprattutto le attività didattiche e formative;
- Salvaguardare e potenziare gli spazi adibiti ad attività sportive all'aperto;
- Riorganizzare e ampliare per quanto possibile il settore colloqui secondo le nuove indicazioni e le previsioni del regolamento penitenziario, con particolare attenzione alla individuazione di spazi per i minori, di un'area esterna dotata di giochi e attrezzature per la permanenza all'esterno, di un piccolo settore riservato agli incontri con i nuclei familiari;
- Realizzare il miglioramento sismico delle strutture e l'efficientamento energetico.

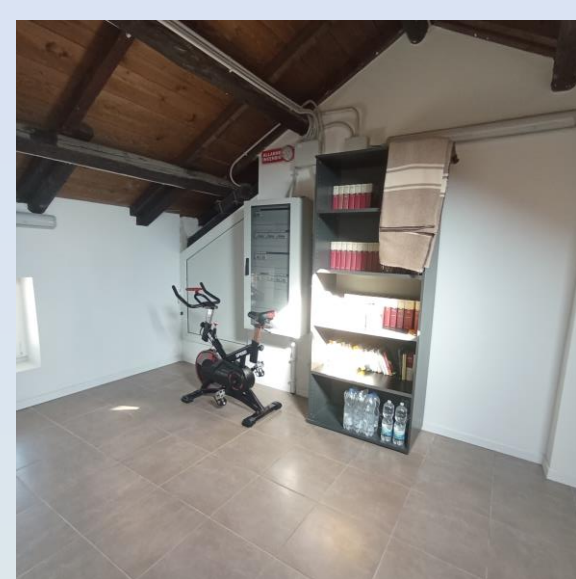


SALETTA SOTTOTETTO E CAMERA DETENTIVA DOPO LA CONSEGNA



CAMERA DETENTIVA



BAGNO CAMERA DETENTIVA

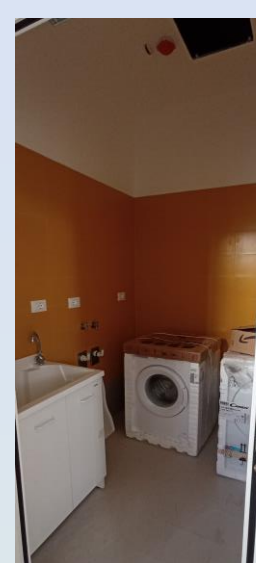

LAVANDERIA



CORRIDOIO SEZIONE



SOGGIORNO A LAVORI ULTIMATI



SOGGIORNO – ANGOLO COTTURA – DOPO LA CONSEGNA



CAMERA DETENTIVA DOPO LA CONSEGNA

I progetti esecutivi sono stati elaborati dalla Società F-Project S.r.l.



**ZONA «A» SEZIONE SEMILIBERTA'
CONSEGNA IN DATA 30 APRILE 2024**

ZONA «B»
RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX FEMMINILE PER LA CREAZIONE DI UN POLO DIDATTICO-FORMATIVO
AREA DIDATTICA



AREA DIDATTICA – CORRIDOIO



AREA DIDATTICA – AULA SCOLASTICA



L'AREA DIDATTICA OCCUPA UNA PARTE DEL PRIMO PIANO DELL'EDIFICIO PRINCIPALE, E CONSTA DI N. 4 AULE, DUE STANZE PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (CARITAS E ICARO), E UNA BIBLIOTECA CON SPAZI PER LA LETTURA E SCRITTURA CREATIVA. LE AULE SONO GIÀ UTILIZZATE E SONO STATI AVVIATI I CORSI SCOLASTICI ALL'INIZIO DI OTTOBRE.

I progetti esecutivi sono stati elaborati dalla Società F-Project S.r.l.

ZONA «B»

EDIFICIO EX FEMMINILE

POLO FORMATIVO

LAVORI IN CORSO

I progetti esecutivi sono stati elaborati dalla Società F-Project S.r.l.



PIANO PRIMO LAVORI IN CORSO



PIANO PRIMO – LAVORI IN CORSO



PIANO PRIMO – BIBLIOTECA - FASE DI ESECUZIONE LAVORI



PIANO PRIMO - BIBLIOTECA



PIANO PRIMO – CORRIDOIO



PIANO TERRA – LAVORI IN CORSO



PIANO TERRA – LAVORI IN CORSO



**REALIZZAZIONE SALA
POLIVALENTE/TEATRO
(APPALTO
AGGIUDICATO –
CONTRATTO DEL
22/04/2024)**

**RISTRUTTURAZIONE E
RIORGANIZZAZIONE
SETTORE COLLOQUI E
AREA VERDE PER
COLLOQUI ALL'APERTO
(APPALTO
AGGIUDICATO –
CONTRATTO DEL
12/09/2024)**



PLANIMETRIA GENERALE CASA CIRCONDARIALE UDINE

REALIZZAZIONE SALA POLIVALENTE/TEATRO

RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE SETTORE COLLOQUI E AREA VERDE PER COLLOQUI ALL'APERTO

ESIGENZE


- Creare uno spazio polivalente di capienza adeguata allo svolgimento di attività comuni di intrattenimento (proiezioni cinematografiche, laboratori teatrali, ecc.) per i detenuti, per eventi e cerimonie, convegni, feste, rappresentazioni teatrali, giornate celebrative, aperti a persone esterne al carcere (familiari, associazioni, comunità cittadina, autorità ecc.);
- Riorganizzare e ampliare per quanto possibile il settore colloqui secondo le nuove indicazioni e le previsioni del regolamento penitenziario, con particolare attenzione alla individuazione di spazi per i minori, di un'area esterna dotata di giochi e attrezzature per la permanenza all'esterno, di un piccolo settore riservato agli incontri con i nuclei familiari;

REALIZZAZIONE SALA POLIVALENTE/TEATRO E RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE SETTORE COLLOQUI E AREA VERDE PER COLLOQUI ALL'APERTO





SALA COLLOQUI

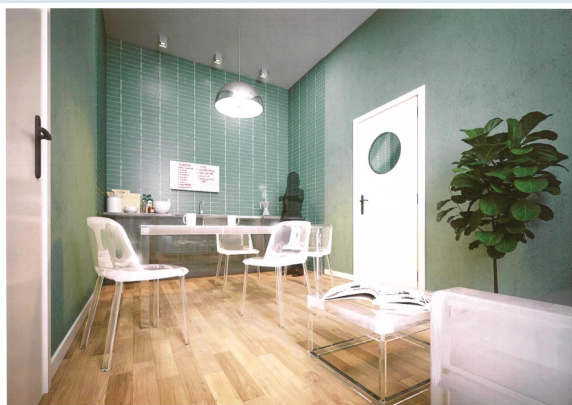

SALETTA COLLOQUI NUCLEI FAMILIARI




AREA VERDE COLLOQUI ALL'APERTO




PLANIMETRIA GENERALE CASA CIRCONDARIALE UDINE




SALA POLIVALENTE - SPAZIO ESTERNO

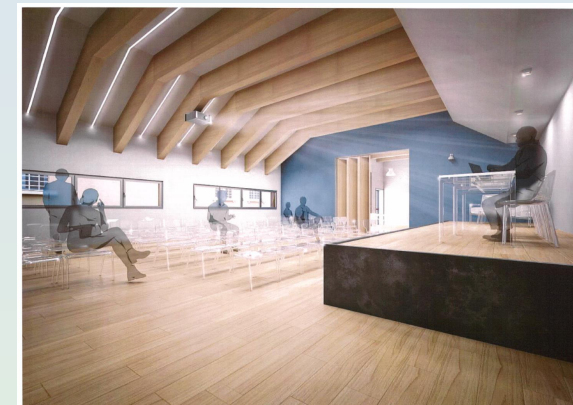

INTERNO DELLA SALA POLIVALENTE/TEATRO

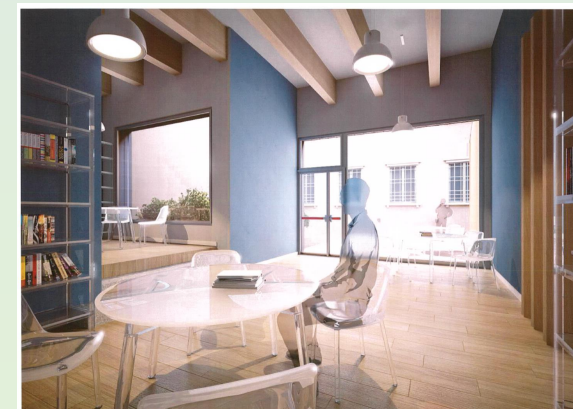


ZONA BIBLIOTECA - LABORATORI TEATRALI



*I progetti esecutivi sono stati elaborati dallo Studio
Associato Barreca & La Varra*




**PROGETTO SALA POLIFUNZIONALE – VEDUTA ESETRNA
DELL’EDIFICIO E DEGLI SPAZI ALL’APERTO**

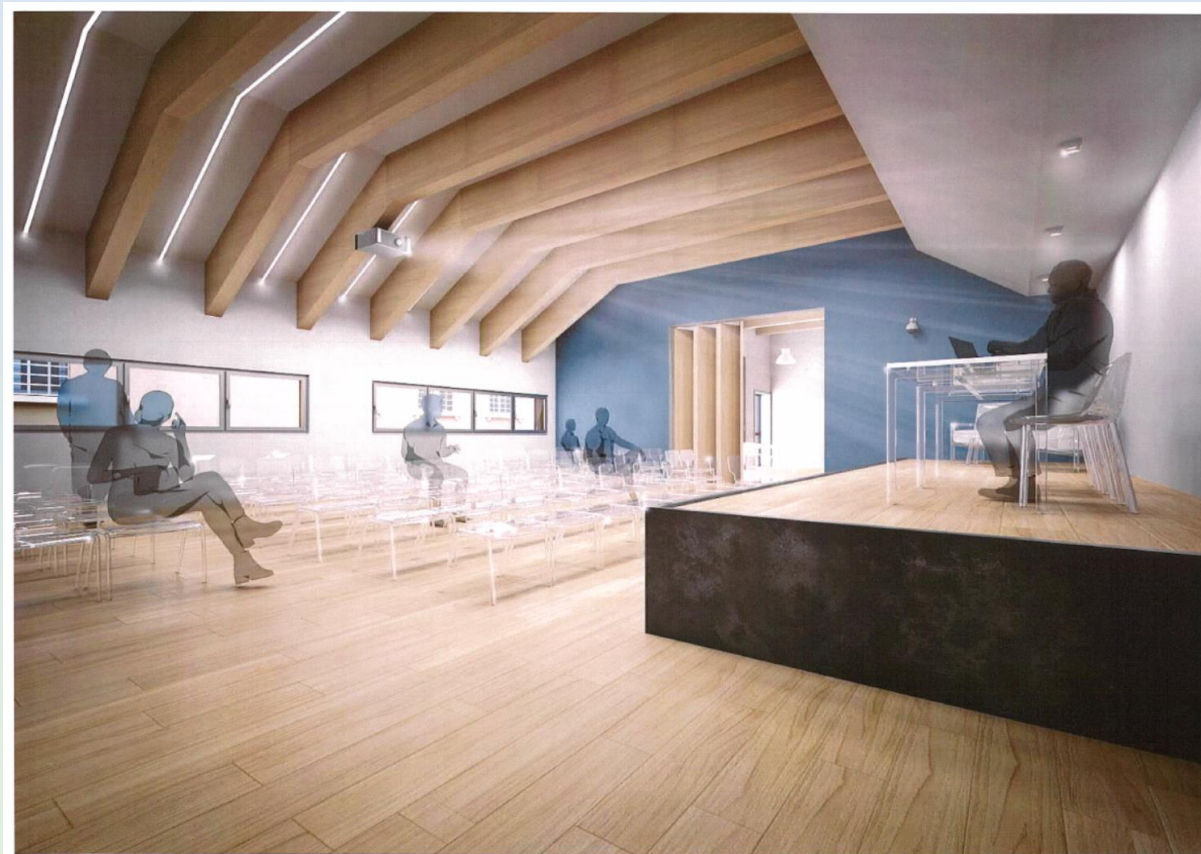

PROGETTO SALA POLIFUNZIONALE – TEATRO VEDUTA INTERNA




*I progetti esecutivi sono stati elaborati dallo Studio
Associato Barreca & La Varra*

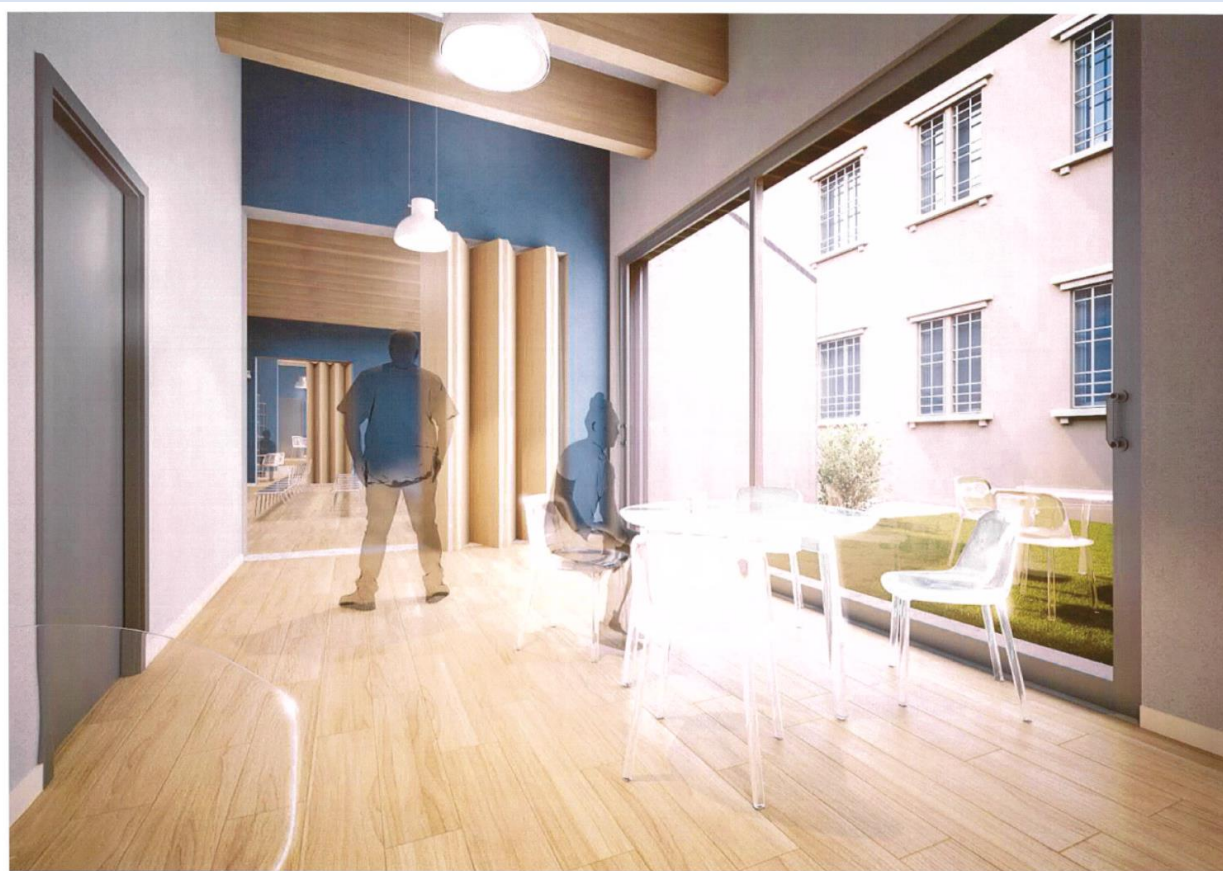

PROGETTO SALA POLIFUNZIONALE – VEDUTA DELLE SALE ANNESSE – LABORATORI TEATRALI – SALA MUSICA



*I progetti esecutivi sono stati elaborati dallo Studio
Associato Barreca & La Varra*

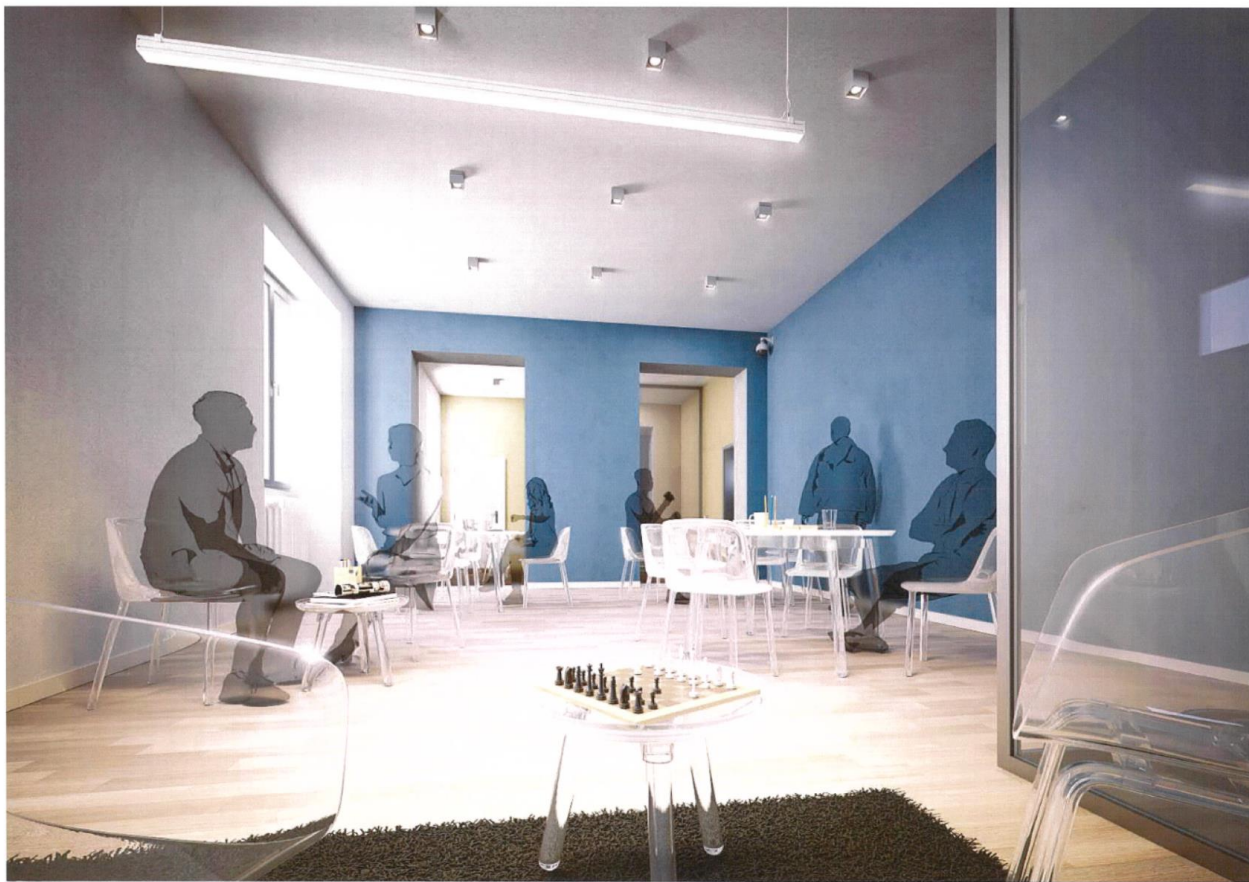

PROGETTO SETTORE COLLOQUI DETENUTI – FAMILIARI
VEDUTA SALA COLLOQUI




PROGETTO SETTORE COLLOQUI – VEDUTA AREA COLLOQUI ESTERNA DOTATA DI GIOCHI E ATTREZZATURE PER
LA PERMANENZA ALL'ESTERNO

PROGETTO SETTORE COLLOQUI

Zona dedicata ai
colloqui riservati agli
incontri con i nuclei
familiari, dotata di
bagno interno e
angolo cottura

*I progetti esecutivi sono stati elaborati
dallo Studio Associato Barreca & La Varra*






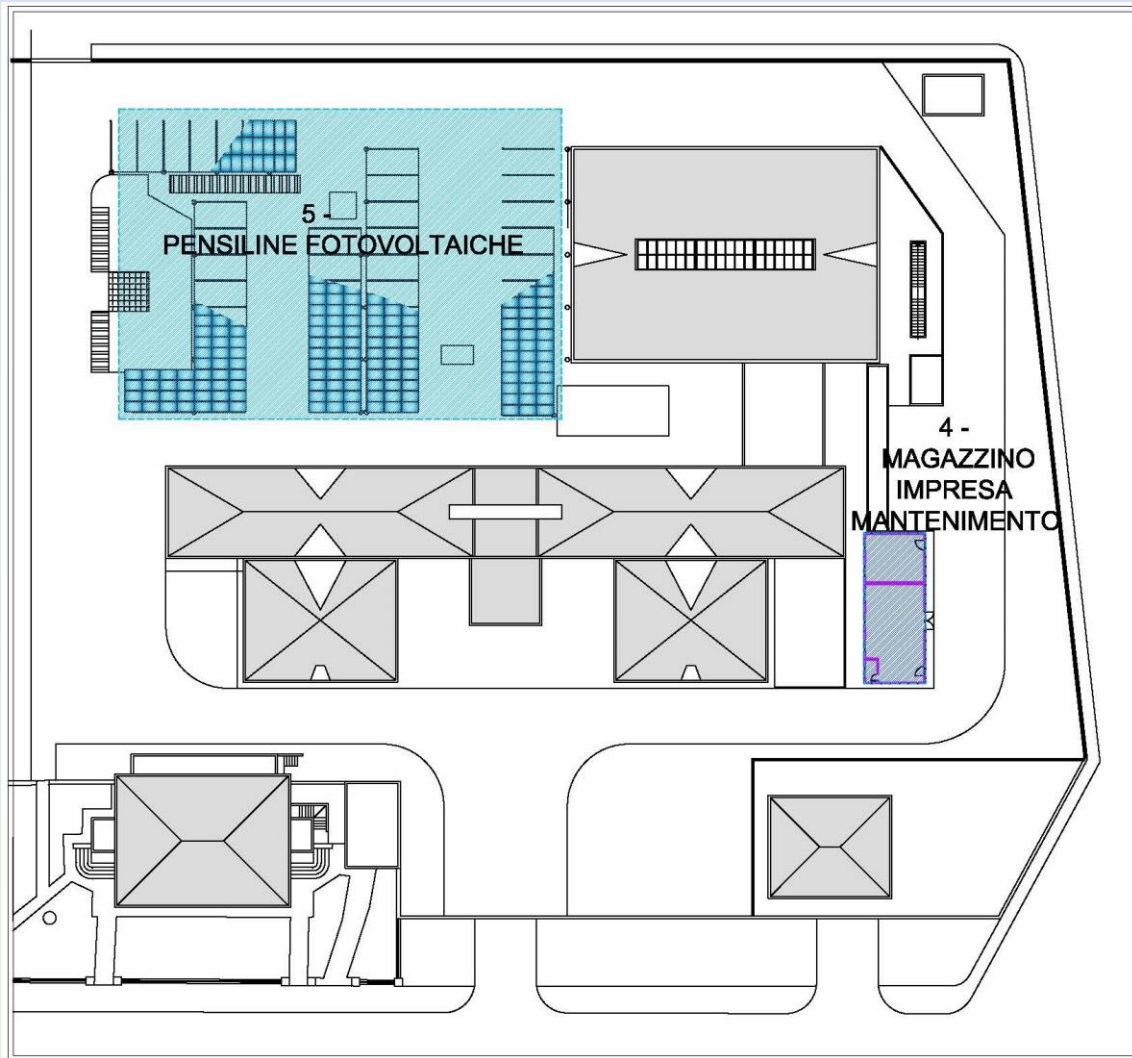

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE PENSILINE FOTOVOLTAICHE
PARCHEGGI E MICRORETE DI GENERATORI DA FONTI RINNOVABILI.**


**IL PROGETTO ESECUTIVO CONCLUSO E VALIDATO – IN CORSO L’AVVIO
DELLE PROCEDURE DI GARA**

DESIGN PIÙ LEGGERO. LA VERSIONE CON BASI IN CEMENTO ARMATO SI INSTALLA IN SEMPLICE APPROGGIO, SENZA NECESSITARE DI FISSAGGIO AL SUOLO. LA STRUTTURA SUPPORTA QUALSIASI MODELLO E DIMENSIONE DI PANNELLO FOTOVOLTAICO.
(I pannelli fotovoltaici non sono forniti)

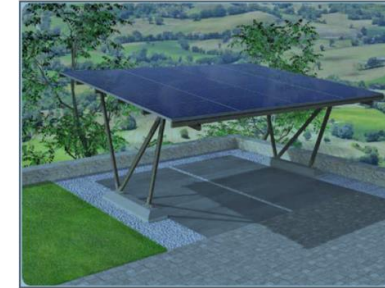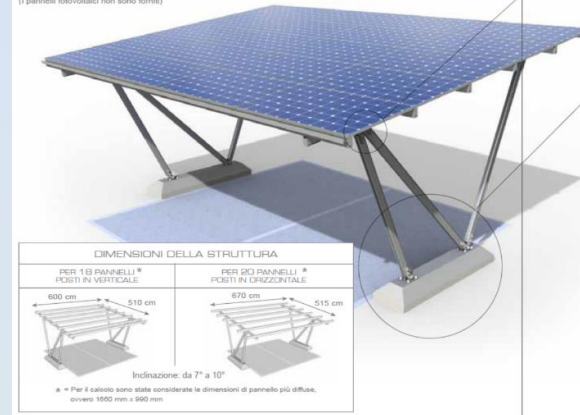


PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MAGAZZINO PER L’IMPRESA DI MANTENIMENTO

**PROGETTO IN CORSO – INSERITO NELLA
PROGRAMMAZIONE PER L’ANNO 2024**



NUOVO MAGAZZINO - PIANTA




NUOVO MAGAZZINO - PROSPETTO PRINCIPALE



**PROGETTO DI
RECUPERO E
RISANAMENTO
SOTTOTETTO
EDIFICIO
PRINCIPALE**



**PROGETTAZIONE
ESECUTIVA
AFFIDATA A
SOCIETÀ DI
PROGETTAZIONE, IN
CORSO
SOPRALLUOGHI
PRELIMINARI
ALL'AVVIO
DELL'ESECUZIONE
DEL CONTRATTO**

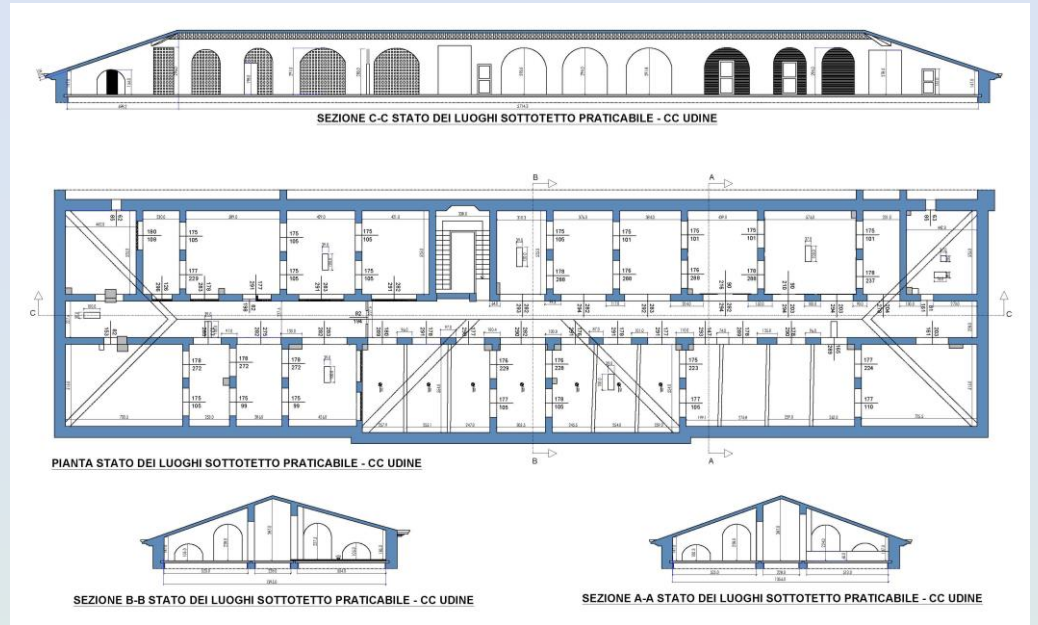


TUTTI GLI AMBIENTI DEL SOTTOTETTO DI SUPERFICIE TOTALE PARI A CIRCA 700 MQ, SARANNO ADEGUATI STRUTTURAMENTE, PREVEDENDO IL RIFACIMENTO COMPLETO DEGLI IMPIANTI, e la creazione di un montacarichi collocato nel vano scala




PROGETTO PER LA CREAZIONE DI SPAZI DI SOCIALITA' NELLA SEZIONE CAMEROTTI E RIQUALIFICAZIONE E ALLESTIMENTO CORTILE DI PASSEGGIO

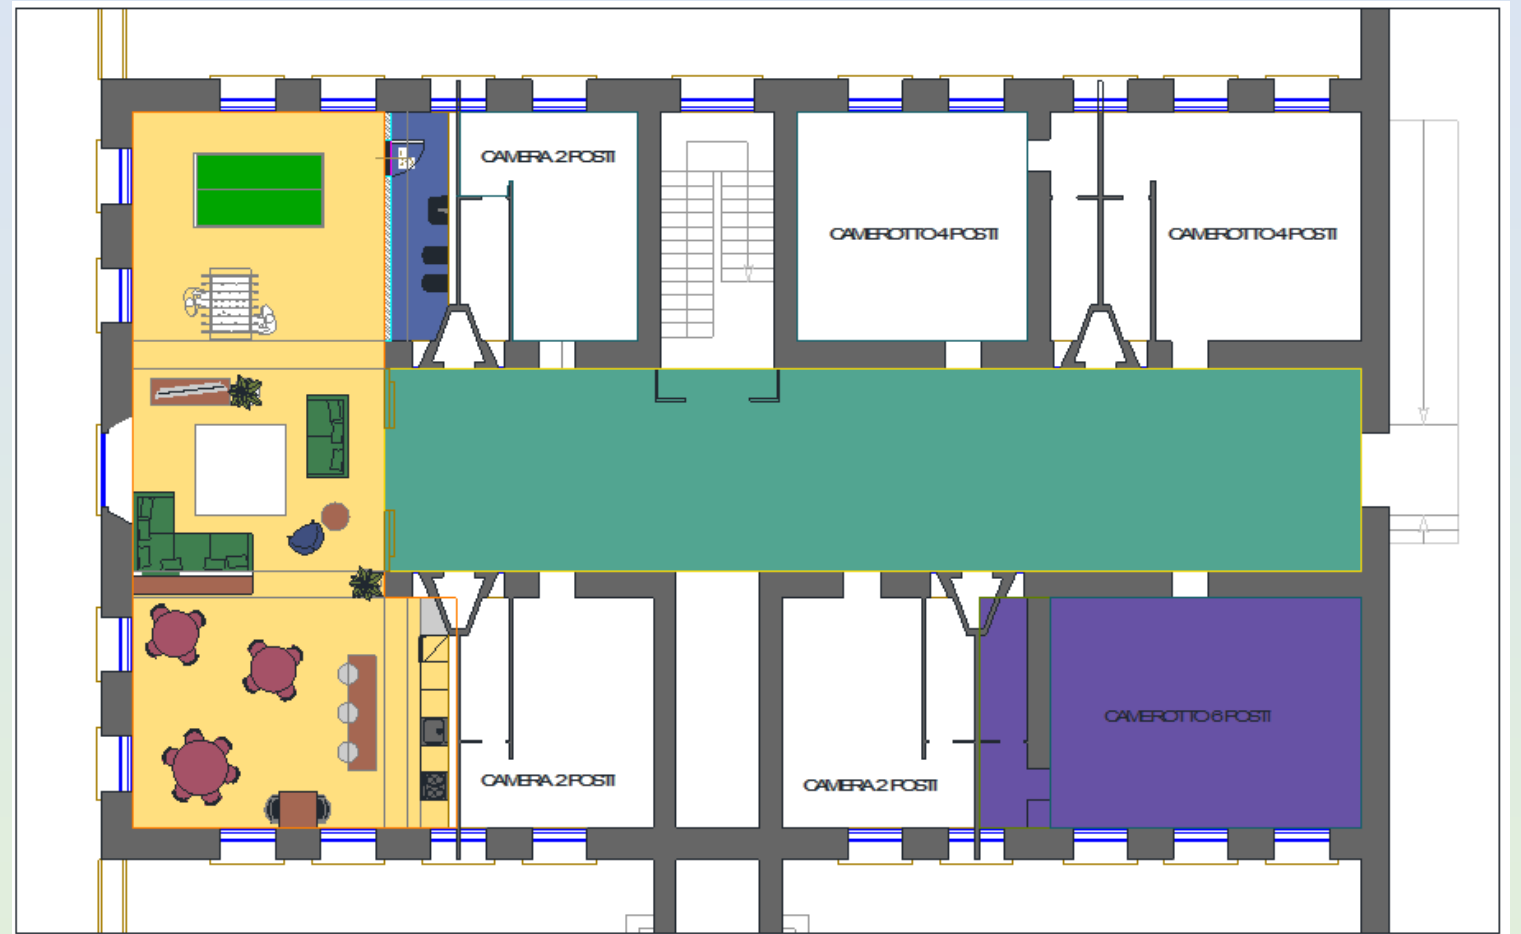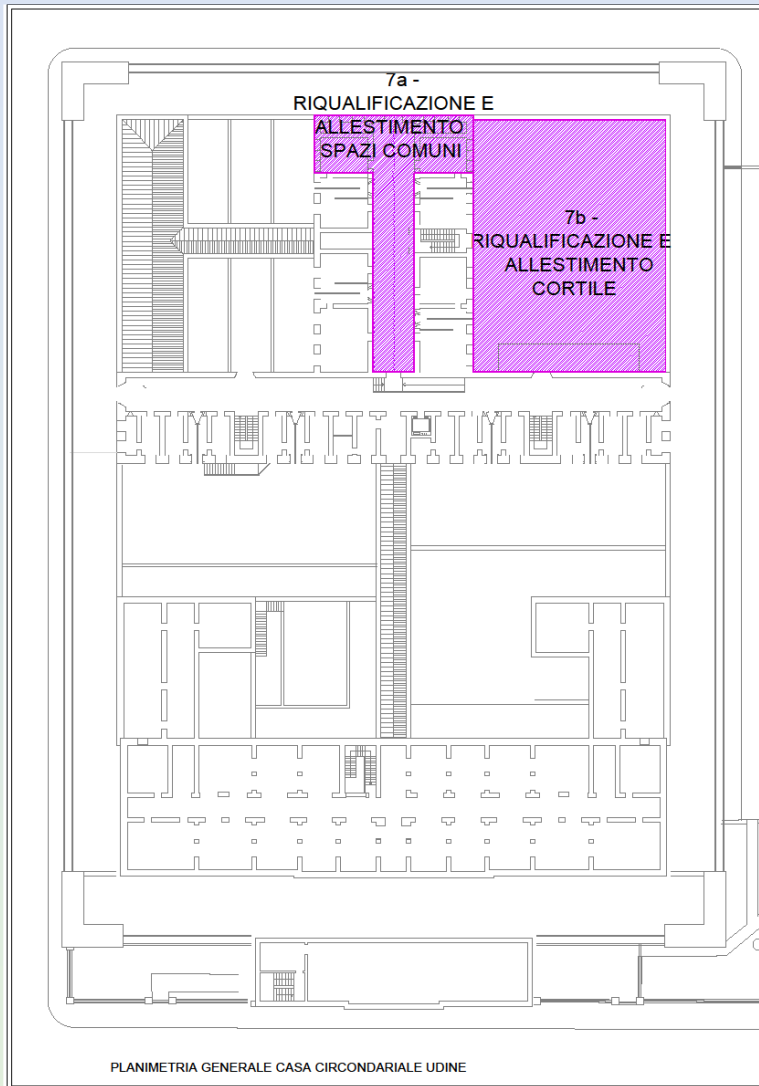

La proposta progettuale è scaturita dal lavoro finale del workshop LA CITTÀ COSTRETTA NUOVI SPAZI PER LA CASA CIRCONDARIALE DI UDINE tenutosi dal 2 al 5 maggio presso la Casa Circondariale di Udine, nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra il Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e Università di Udine – Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura, siglato nell'ottobre 2022.

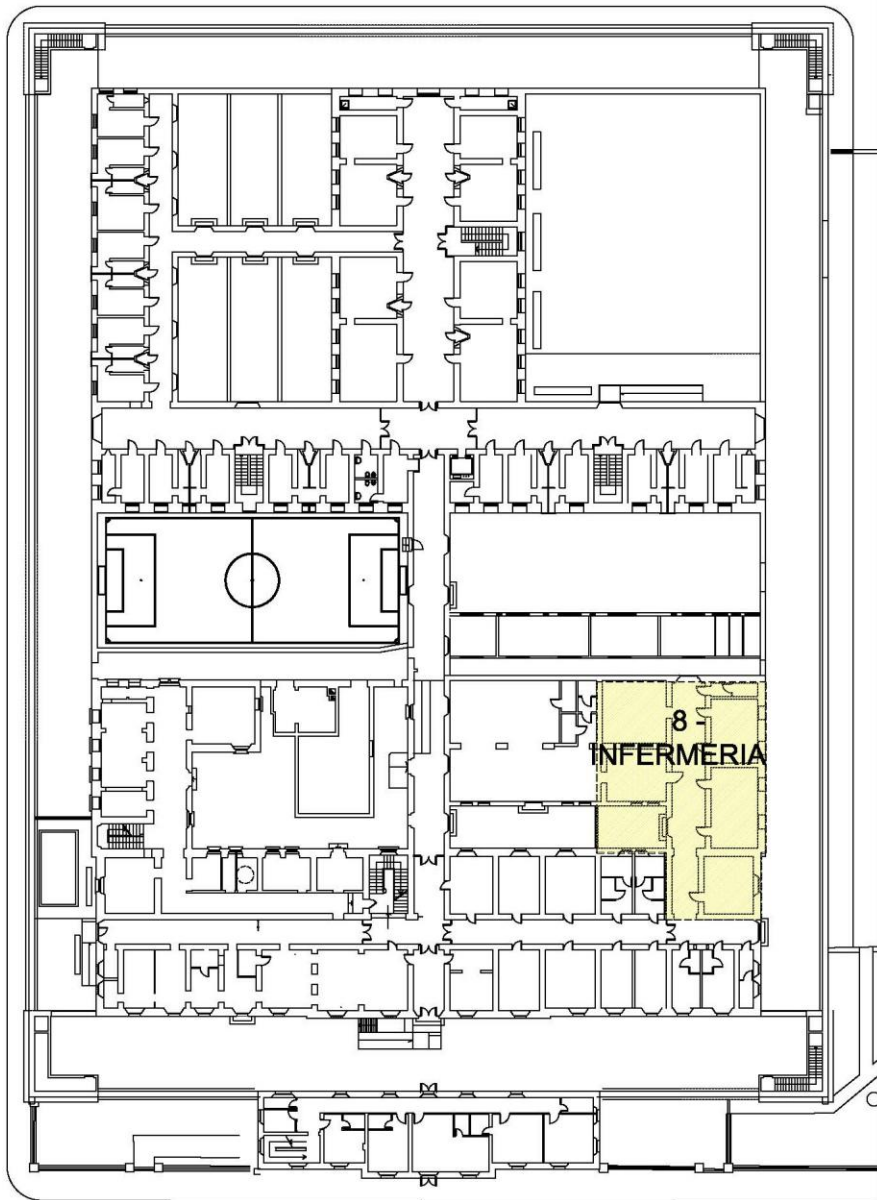

PLANIMETRIA GENERALE CASA CIRCONDARIALE UDINE

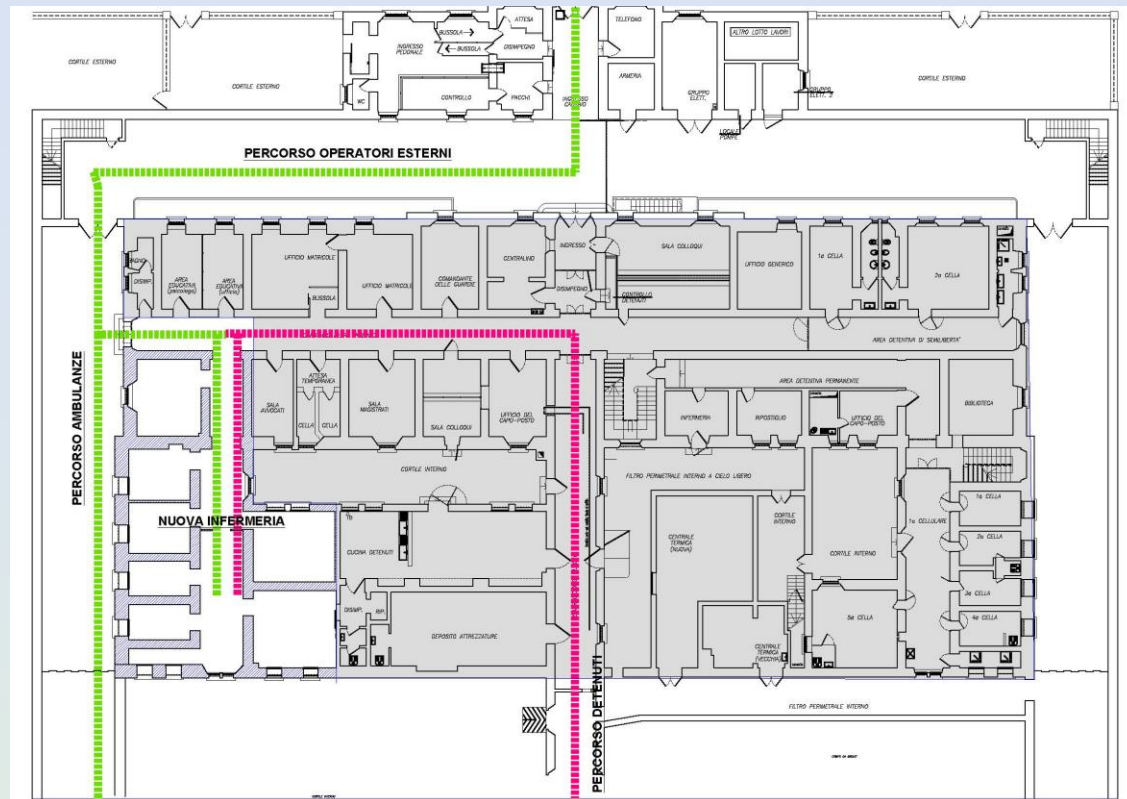

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO REPARTO INFERMERIA AL PIANO TERRA

NELL'AMBITO DELLA RIORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO E' EMERSA L'OPPORTUNITA' DI SPOSTARE L'INFERMERIA AL PIANO TERRA, PROCEDENDO AD UNA DIVERSA COLLOCAZIONE DEI LOCALI DEL MAGAZZINO IMPRESA DI MANTENIMENTO E DI ALTRE ATTIVITA' CHE VERRANNO DISLOCATE NEGLI SPAZI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA REALIZZAZIONE.

LA NUOVA INFERMERIA SARA' DOTATA DI AMBULATORI, STANZE PER IL PERSONALE SANITARIO, LABORATORIO ODONTOIATRICO, FARMACIA E SERVIZI ANNESSI.

L'INTERVENTO INSERITO NELLA PROGRAMMAZIONE PER L'ANNO 2024

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

	LAVORI	2024				2025												2026												
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6							
1	LAVORI I LOTTO - SEZIONE SEMILIBERI	REPARTO CONSEGNA TO - SEZIONE ATTIVA	REPARTO CONSEGNA TO - SEZIONE ATTIVA	REPARTO CONSEGNA TO - SEZIONE ATTIVA	FINE LAVORI CONTO FINALE	COLLAUDO																								
	LAVORI I LOTTO - LOCALI ATTIVITA' SCOLASTICHE I° PIANO	LAVORI	REPARTO CONSEGNA TO - DIDATTICA ATTIVA	REPARTO CONSEGNA TO - DIDATTICA ATTIVA																										
	LAVORI I LOTTO - LOCALI EX FEMMINILE	LAVORI	LAVORI	LAVORI																										
	LAVORI I LOTTO - CAMPO CALCETTO	-	-	LAVORI																										
2	SALA POLIFUNZIONALE - Contratto stipulato	-	TRASFERIM. DEFINITIVO AREA DIDATTICA	CONSEGNA LAVORI	LAVORI	LAVORI	LAVORI	LAVORI	LAVORI	LAVORI	LAVORI	LAVORI	LAVORI	REG. ESECUZ.	REG. ESECUZ.	REG. ESECUZ.														
3	SETTORE COLLOQUI - Contratto stipulato	-	-	-	TRASFERIM. PROVVISORIO SERVIZIO COLLOQUI	TRASFERIM. PROVVISORIO SERVIZIO COLLOQUI	LAVORI	LAVORI	LAVORI	LAVORI	LAVORI	REG. ESECUZ.	REG. ESECUZ.	REG. ESECUZ.																
4	RIFACIMENTO ASFALTO AREA CASERMA AGENTI - Contratto stipulato	-	-	NOMINA DL	LAVORI	LAVORI	LAVORI	REG. ESECUZ.																						
5	PENSILINE FOTOVOLTAICHE	VALIDAZIONE PROGETTO	GARA	GARA	GARA	AGGIUD. E STIPULA CONTRATTO	LAVORI	LAVORI	LAVORI	LAVORI	LAVORI	REG. ESECUZ.	REG. ESECUZ.	REG. ESECUZ.																
6	SOTTOTETTO	-	-	AVVIO PROGETTAZ.	ESECUZIONE CONTRATTO	ESECUZIONE CONTRATTO	VALIDAZIONE PROGETTO	GARA	GARA	AGGIUD. E STIPULA CONTRATTO	LAVORI	LAVORI	LAVORI	LAVORI	LAVORI	LAVORI	REG. ESECUZ.	REG. ESECUZ.	REG. ESECUZ.											
7	MAGAZZINO IMPRESA MANTENIMENTO	-	-	PERIZIA	GARA	GARA	AGGIUD. E STIPULA CONTRATTO	LAVORI	LAVORI	LAVORI	REG. ESECUZ.																			
8	SPAZI COMUNI SEZIONI DETENTIVE E CORTILE PASSEGGIO	-	-	D.I.P.	AFFIDAM. PROGETTAZ.	AFFIDAM. PROGETTAZ.	ESECUZIONE CONTRATTO	ESECUZIONE CONTRATTO	ESECUZIONE CONTRATTO	VALIDAZIONE PROGETTO	GARA	GARA	GARA	LAVORI	LAVORI	LAVORI	LAVORI	LAVORI	LAVORI	REG. ESECUZ.	REG. ESECUZ.	REG. ESECUZ.								
9	NUOVO REPARTO INFERMERIA	-	-	D.I.P.	AFFIDAM. PROGETTAZ.	AFFIDAM. PROGETTAZ.	ESECUZIONE CONTRATTO	ESECUZIONE CONTRATTO	ESECUZIONE CONTRATTO	VALIDAZIONE PROGETTO	GARA	GARA	GARA	LAVORI	LAVORI	LAVORI	LAVORI	LAVORI	LAVORI	REG. ESECUZ.	REG. ESECUZ.	REG. ESECUZ.								
